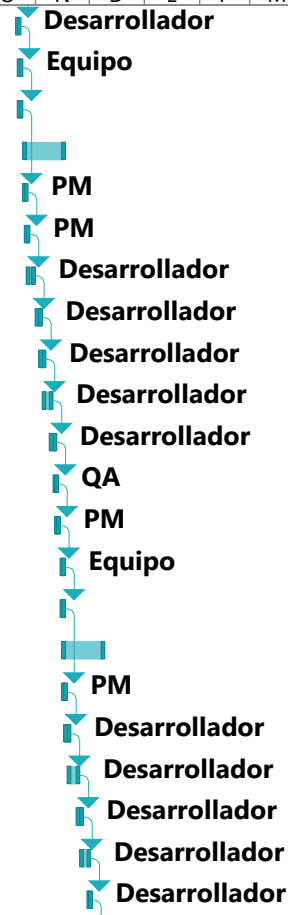


| Id |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   |   | Semestre 2 |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|
|    |                                                                                   |                                                                                     |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M | J          | J | A |  |
| 1  |                                                                                   |    | PROYECTO: Implemen    | 189 días | mar 15/09/26 | vie 04/06/27 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 2  |                                                                                   |    | SPRINT 1 – Preparaci  | 14 días  | mar 15/09/26 | vie 02/10/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 3  |                                                                                   |    | 1.1 Inicio del Sprint | 1 día    | mar 15/09/26 | mar 15/09/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 4  |                                                                                   |    | 1.2 Presentación del  | 1 día    | mié 16/09/26 | mié 16/09/26 | 3            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 5  |                                                                                   |    | 1.3 Asignación de re  | 1 día    | jue 17/09/26 | jue 17/09/26 | 4            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 6  |                                                                                   |    | 1.4 Configuración de  | 2 días   | vie 18/09/26 | lun 21/09/26 | 5            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 7  |                                                                                   |    | 1.5 Configuración de  | 2 días   | mar 22/09/26 | mié 23/09/26 | 6            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 8  |                                                                                   |    | 1.6 Configuración de  | 2 días   | jue 24/09/26 | vie 25/09/26 | 7            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 9  |                                                                                   |    | 1.7 Configuración de  | 2 días   | lun 28/09/26 | mar 29/09/26 | 8            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 10 |                                                                                   |    | 1.8 Revisión del Pro  | 1 día    | mié 30/09/26 | mié 30/09/26 | 9            |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 11 |                                                                                   |    | 1.9 Validación del S  | 1 día    | jue 01/10/26 | jue 01/10/26 | 10           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 12 |                                                                                   |    | 1.10 Sprint Review +  | 1 día    | vie 02/10/26 | vie 02/10/26 | 11           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 13 |                                                                                   |    | H1 Inicio de Implem   | 1 día    | vie 02/10/26 | vie 02/10/26 | 12           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 14 |                                                                                   |    | SPRINT 2 – Módulo de  | 15 días  | lun 05/10/26 | vie 23/10/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 15 |                                                                                   |    | 2.1 Sprint Planning   | 1 día    | lun 05/10/26 | lun 05/10/26 | 13           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 16 |                                                                                   |    | 2.2 Reunión con el d  | 1 día    | mar 06/10/26 | mar 06/10/26 | 15           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 17 |                                                                                   |    | 2.3 Desarrollo Regist | 3 días   | mié 07/10/26 | vie 09/10/26 | 16           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 18 |                                                                                   |    | 2.4 Desarrollo Consu  | 2 días   | lun 12/10/26 | mar 13/10/26 | 17           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 19 |                                                                                   |    | 2.5 Actualizar alum   | 2 días   | mié 14/10/26 | jue 15/10/26 | 18           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 20 |                                                                                   |    | 2.6 Baja lógica       | 1 día    | vie 16/10/26 | vie 16/10/26 | 19           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 21 |                                                                                   |    | 2.7 Pruebas unitaria  | 2 días   | lun 19/10/26 | mar 20/10/26 | 20           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |
| 22 |                                                                                   |  | 2.8 Capacitación al a | 1 día    | mié 21/10/26 | mié 21/10/26 | 21           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |

|                                                                                      |                      |             |                           |             |                 |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| <div> <div>Proyecto: Cronograma_!2Sprint</div> <div>Fecha: mar 14/07/26</div> </div> | Tarea                | <div></div> | Resumen inactivo          | <div></div> | Tareas externas | <div></div> |
|                                                                                      | División             | <div></div> | Tarea manual              | <div></div> | Hito externo    | <div></div> |
|                                                                                      | Hito                 | <div></div> | solo duración             | <div></div> | Fecha límite    | <div></div> |
|                                                                                      | Resumen              | <div></div> | Informe de resumen manual | <div></div> | Progreso        | <div></div> |
|                                                                                      | Resumen del proyecto | <div></div> | Resumen manual            | <div></div> | Progreso manual | <div></div> |
|                                                                                      | Tarea inactiva       | <div></div> | solo el comienzo          | <div></div> |                 |             |
|                                                                                      | Hito inactivo        | <div></div> | solo fin                  | <div></div> |                 |             |

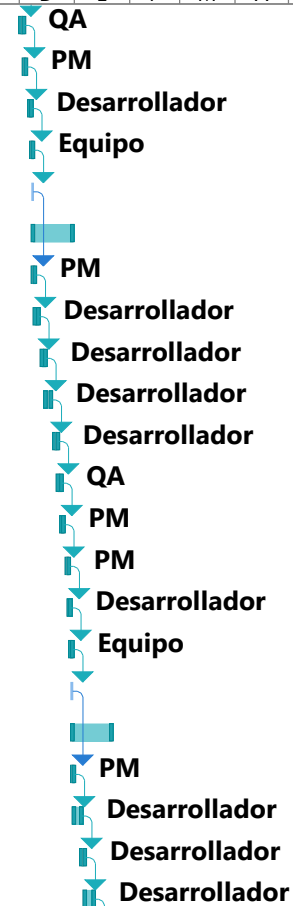
| Id |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   |   | Semestre 2 |   |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|
|    |  |                                                                                     |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M | J          | A |
| 23 |  |    | 2.9 Correcciones seg  | 1 día    | jue 22/10/26 | jue 22/10/26 | 22           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 24 |  |    | 2.10 Sprint Review y  | 1 día    | vie 23/10/26 | vie 23/10/26 | 23           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 25 |  |    | H2 Módulo Alumnos     | 1 día    | vie 23/10/26 | vie 23/10/26 | 24           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 26 |  |    | SPRINT 3 – Módulo de  | 16 días  | lun 26/10/26 | lun 16/11/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 27 |  |    | 3.1 Sprint Planning   | 1 día    | lun 26/10/26 | lun 26/10/26 | 25           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 28 |  |    | 3.2 Levantamiento de  | 1 día    | mar 27/10/26 | mar 27/10/26 | 27           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 29 |  |    | 3.3 Programación de   | 3 días   | mié 28/10/26 | vie 30/10/26 | 28           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 30 |  |    | 3.4 Asignación de in  | 2 días   | lun 02/11/26 | mar 03/11/26 | 29           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 31 |  |    | 3.5 Agenda semanal    | 2 días   | mié 04/11/26 | jue 05/11/26 | 30           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 32 |  |    | 3.6 Registro de asist | 2 días   | vie 06/11/26 | lun 09/11/26 | 31           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 33 |  |    | 3.7 Reprogramación    | 2 días   | mar 10/11/26 | mié 11/11/26 | 32           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 34 |  |    | 3.8 Pruebas funcion   | 1 día    | jue 12/11/26 | jue 12/11/26 | 33           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 35 |  |    | 3.9 Capacitación a in | 1 día    | vie 13/11/26 | vie 13/11/26 | 34           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 36 |  |    | 3.10 Sprint Review    | 1 día    | lun 16/11/26 | lun 16/11/26 | 35           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 37 |  |    | H3 Gestión de Clase   | 1 día    | lun 16/11/26 | lun 16/11/26 | 36           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 38 |  |    | SPRINT 4 – Comunica   | 16 días  | mar 17/11/26 | mar 08/12/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 39 |  |    | 4.1 Sprint Planning   | 1 día    | mar 17/11/26 | mar 17/11/26 | 37           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 40 |  |    | 4.2 Configuración W   | 2 días   | mié 18/11/26 | jue 19/11/26 | 39           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 41 |  |    | 4.3 Notificaciones a  | 3 días   | vie 20/11/26 | mar 24/11/26 | 40           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 42 |  |   | 4.4 Recordatorios de  | 2 días   | mié 25/11/26 | jue 26/11/26 | 41           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 43 |  |  | 4.5 Mensajería masi   | 2 días   | vie 27/11/26 | lun 30/11/26 | 42           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 44 |  |  | 4.6 Historial de men  | 1 día    | mar 01/12/26 | mar 01/12/26 | 43           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |



Proyecto: Cronograma\_!2Sprint  
Fecha: mar 14/07/26

|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |

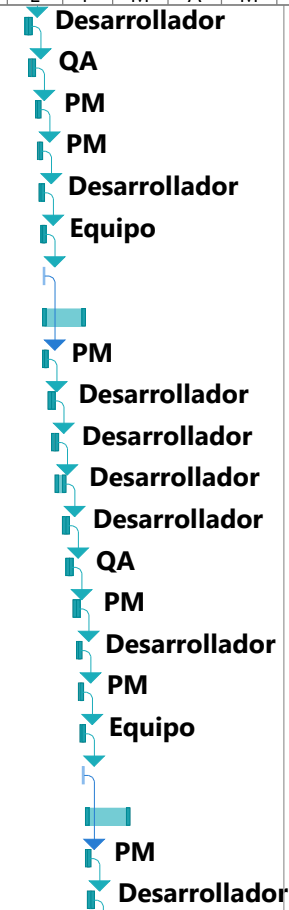
| Id |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   |   | Semestre 2 |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|
|    |                                                                                   |                                                                                     |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M | J          | A |
| 45 |                                                                                   |    | 4.7 Pruebas de com    | 2 días   | mié 02/12/26 | jue 03/12/26 | 44           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 46 |                                                                                   |    | 4.8 Capacitación del  | 1 día    | vie 04/12/26 | vie 04/12/26 | 45           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 47 |                                                                                   |    | 4.9 Correcciones      | 1 día    | lun 07/12/26 | lun 07/12/26 | 46           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 48 |                                                                                   |    | 4.10 Sprint Review    | 1 día    | mar 08/12/26 | mar 08/12/26 | 47           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 49 |                                                                                   |    | H4 Comunicaciones     | 1 día    | mar 08/12/26 | mar 08/12/26 | 48           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 50 |                                                                                   |    | SPRINT 5 – Módulo Fi  | 16 días  | mié 09/12/26 | mié 30/12/26 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 51 |                                                                                   |    | 5.1 Sprint Planning   | 1 día    | mié 09/12/26 | mié 09/12/26 | 49           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 52 |                                                                                   |    | 5.2 Registro de pago  | 2 días   | jue 10/12/26 | vie 11/12/26 | 51           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 53 |                                                                                   |    | 5.3 Control de cuota  | 2 días   | lun 14/12/26 | mar 15/12/26 | 52           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 54 |                                                                                   |    | 5.4 Reportes financi  | 3 días   | mié 16/12/26 | vie 18/12/26 | 53           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 55 |                                                                                   |    | 5.5 Ajustes y anulaci | 2 días   | lun 21/12/26 | mar 22/12/26 | 54           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 56 |                                                                                   |    | 5.6 Pruebas funcion   | 2 días   | mié 23/12/26 | jue 24/12/26 | 55           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 57 |                                                                                   |    | 5.7 Validación con a  | 1 día    | vie 25/12/26 | vie 25/12/26 | 56           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 58 |                                                                                   |    | 5.8 Capacitación al e | 1 día    | lun 28/12/26 | lun 28/12/26 | 57           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 59 |                                                                                   |    | 5.9 Correcciones      | 1 día    | mar 29/12/26 | mar 29/12/26 | 58           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 60 |                                                                                   |    | 5.10 Sprint Review    | 1 día    | mié 30/12/26 | mié 30/12/26 | 59           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 61 |                                                                                   |    | H5 Finanzas Operati   | 1 día    | mié 30/12/26 | mié 30/12/26 | 60           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 62 |                                                                                   |    | SPRINT 6 – Indicadore | 16 días  | jue 31/12/26 | jue 21/01/27 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 63 |                                                                                   |    | 6.1 Sprint Planning   | 1 día    | jue 31/12/26 | jue 31/12/26 | 61           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 64 |                                                                                   |   | 6.2 Indicadores acad  | 2 días   | vie 01/01/27 | lun 04/01/27 | 63           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 65 |                                                                                   |  | 6.3 Indicadores finar | 2 días   | mar 05/01/27 | mié 06/01/27 | 64           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |
| 66 |                                                                                   |  | 6.4 Dashboard gerer   | 3 días   | jue 07/01/27 | lun 11/01/27 | 65           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |




Proyecto: Cronograma\_!2Sprint  
Fecha: mar 14/07/26

|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |


| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea     | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   |   | Semestre 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                     |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M | J          | J | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |                                                                                   |  | 6.5 Exportación PDF | 2 días   | mar 12/01/27 | mié 13/01/27 | 66           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





Proyecto: Cronograma\_!2Sprint  
Fecha: mar 14/07/26

|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |

| Id |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   |   | Semestre 2 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                   |                                                                                   |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M | J          | J | A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |                                                                                   |  | 8.3 Integración entre | 3 días   | jue 18/02/27 | lun 22/02/27 | 88           |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |            |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto: Cronograma_!2Sprint<br>Fecha: mar 14/07/26 | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                                      | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                                      | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                                      | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                                      | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                                      | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
|                                                      | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |

| Id  |  | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |                                                                                       | Semestre 2    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
|     |                                                                                   |                                                                                     |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A                                                                                     | M             | J |
| 111 |                                                                                   |    | 10.1 Sprint Planning  | 1 día    | jue 01/04/27 | jue 01/04/27 | 109          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 112 |                                                                                   |    | 10.2 Pruebas funcion  | 3 días   | vie 02/04/27 | mar 06/04/27 | 111          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | QA            |   |
| 113 |                                                                                   |    | 10.3 Pruebas de ren   | 2 días   | mié 07/04/27 | jue 08/04/27 | 112          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | QA            |   |
| 114 |                                                                                   |    | 10.4 Pruebas de seg   | 2 días   | vie 09/04/27 | lun 12/04/27 | 113          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | QA            |   |
| 115 |                                                                                   |    | 10.5 Corrección de i  | 2 días   | mar 13/04/27 | mié 14/04/27 | 114          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 116 |                                                                                   |    | 10.6 Validación con   | 2 días   | jue 15/04/27 | vie 16/04/27 | 115          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 117 |                                                                                   |    | 10.7 Revisión del Prc | 1 día    | lun 19/04/27 | lun 19/04/27 | 116          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 118 |                                                                                   |    | 10.8 Aceptación par   | 1 día    | mar 20/04/27 | mar 20/04/27 | 117          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 119 |                                                                                   |    | 10.9 Documentación    | 1 día    | mié 21/04/27 | mié 21/04/27 | 118          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 120 |                                                                                   |    | 10.10 Sprint Review   | 1 día    | jue 22/04/27 | jue 22/04/27 | 119          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Equipo        |   |
| 121 |                                                                                   |    | H10 Sistema Validad   | 1 día    | jue 22/04/27 | jue 22/04/27 | 120          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |               |   |
| 122 |                                                                                   |    | SPRINT 11 – Desplieg  | 16 días  | vie 23/04/27 | vie 14/05/27 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |               |   |
| 123 |                                                                                   |    | 11.1 Sprint Planning  | 1 día    | vie 23/04/27 | vie 23/04/27 | 121          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 124 |                                                                                   |    | 11.2 Preparación prc  | 2 días   | lun 26/04/27 | mar 27/04/27 | 123          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 125 |                                                                                   |    | 11.3 Despliegue del   | 2 días   | mié 28/04/27 | jue 29/04/27 | 124          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 126 |                                                                                   |    | 11.4 Configuración f  | 2 días   | vie 30/04/27 | lun 03/05/27 | 125          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 127 |                                                                                   |    | 11.5 Capacitación fir | 2 días   | mar 04/05/27 | mié 05/05/27 | 126          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | PM            |   |
| 128 |                                                                                   |    | 11.6 Soporte inicial  | 2 días   | jue 06/05/27 | vie 07/05/27 | 127          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 129 |                                                                                   |    | 11.7 Resolución de i  | 2 días   | lun 10/05/27 | mar 11/05/27 | 128          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    | Desarrollador |   |
| 130 |                                                                                   |  | 11.8 Entrega manua    | 1 día    | mié 12/05/27 | mié 12/05/27 | 129          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |  | PM            |   |
| 131 |                                                                                   |  | 11.9 Validación del c | 1 día    | jue 13/05/27 | jue 13/05/27 | 130          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |  | PM            |   |
| 132 |                                                                                   |  | 11.10 Sprint Review   | 1 día    | vie 14/05/27 | vie 14/05/27 | 131          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |  | Equipo        |   |

|                                                                                      |                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Proyecto: Cronograma_!2Sprint</div> <div>Fecha: mar 14/07/26</div> </div> | Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
|                                                                                      | División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
|                                                                                      | Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
|                                                                                      | Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
|                                                                                      | Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
|                                                                                      | Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
|                                                                                      | Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |

| Id  |  | Modo de tarea                                                                     | Nombre de tarea       | Duración | Comienzo     | Fin          | Predecesoras | Semestre 2, 2026 |   |   |   |   |   |   | Semestre 1, 2027 |   |   |   | Semestre 2 |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|------------|---|
|     |                                                                                   |                                                                                   |                       |          |              |              |              | J                | J | A | S | O | N | D | E                | F | M | A | M          | J |
| 133 |                                                                                   |  | H11 Sistema en Proc   | 1 día    | vie 14/05/27 | vie 14/05/27 | 132          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 134 |                                                                                   |  | SPRINT 12 – Cierre de | 14 días  | lun 17/05/27 | jue 03/06/27 |              |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 135 |                                                                                   |  | 12.1 Sprint Planning  | 1 día    | lun 17/05/27 | lun 17/05/27 | 133          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 136 |                                                                                   |  | 12.2 Entrega del MV   | 2 días   | mar 18/05/27 | mié 19/05/27 | 135          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 137 |                                                                                   |  | 12.3 Documentación    | 2 días   | jue 20/05/27 | vie 21/05/27 | 136          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 138 |                                                                                   |  | 12.4 Manual de usu    | 2 días   | lun 24/05/27 | mar 25/05/27 | 137          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 139 |                                                                                   |  | 12.5 Capacitación fir | 2 días   | mié 26/05/27 | jue 27/05/27 | 138          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 140 |                                                                                   |  | 12.6 Acta de acepta   | 1 día    | vie 28/05/27 | vie 28/05/27 | 139          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 141 |                                                                                   |  | 12.7 Lecciones aprer  | 1 día    | lun 31/05/27 | lun 31/05/27 | 140          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 142 |                                                                                   |  | 12.8 Cierre administ  | 1 día    | mar 01/06/27 | mar 01/06/27 | 141          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 143 |                                                                                   |  | 12.9 Presentación d   | 1 día    | mié 02/06/27 | mié 02/06/27 | 142          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 144 |                                                                                   |  | 12.10 Retrospectiva   | 1 día    | jue 03/06/27 | jue 03/06/27 | 143          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |
| 145 |                                                                                   |  | H12 Proyecto Cerrac   | 1 día    | jue 03/06/27 | jue 03/06/27 | 144          |                  |   |   |   |   |   |   |                  |   |   |   |            |   |

PM  
PM  
PM  
PM  
PM  
PM  
PM  
PM  
PM  
Equipo

Proyecto: Cronograma\_12Sprint  
Fecha: mar 14/07/26

|                      |                                                                                     |                           |                                                                                       |                 |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Resumen inactivo          |  | Tareas externas |  |
| División             |  | Tarea manual              |  | Hito externo    |  |
| Hito                 |  | solo duración             |  | Fecha límite    |  |
| Resumen              |  | Informe de resumen manual |  | Progreso        |  |
| Resumen del proyecto |  | Resumen manual            |  | Progreso manual |  |
| Tarea inactiva       |  | solo el comienzo          |  |                 |                                                                                       |
| Hito inactivo        |  | solo fin                  |  |                 |                                                                                       |
